



新庁舎建設だより 12



南九州市新庁舎建設工事進捗状況

[↑ 工事進捗状況はこちら](#)

新庁舎建設工事は、令和7年2月27日時点で、基礎工事を行っています。



新庁舎建設工事現場の様子（2月27日時点：全体）




新庁舎建設工事現場の様子（2月27日時点：真上から）

新庁舎建設工事の工事期間の延長について


新庁舎建設工事の工事期間について、社会情勢などの影響により、建築資材の調達期間に想定以上の日数を要することと、作業人員の確保が困難な状況にあるため、当初の工事期間内の完成が見込めないことから、工事期間を延長することとなりました。

工事期間の延長に伴い、以前お知らせしましたスケジュールを以下のとおり変更いたします。

● 広報紙令和6年6月号時のスケジュール

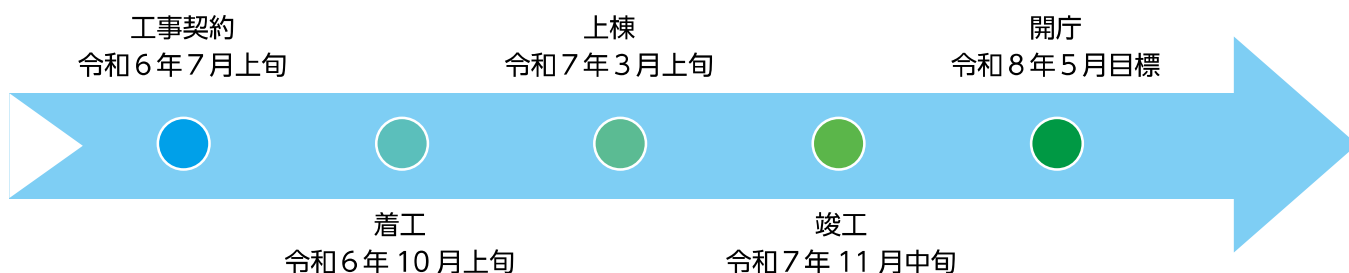

● 変更後のスケジュール

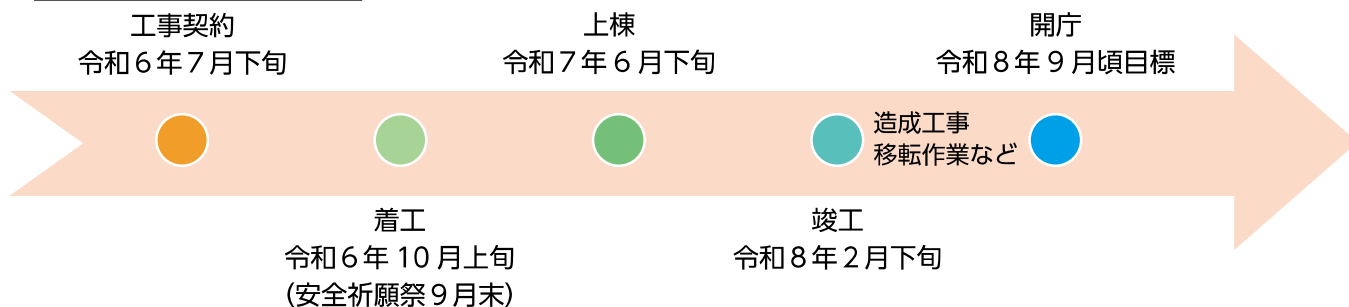

※スケジュールについては、天候などの諸事情により前後する場合があります。

今後も工事に関する変更などが発生した場合は広報紙やホームページなどでお伝えして参ります
