

新庁舎建設だより 15



↑工事進捗状況はこちら

南九州市新庁舎建設工事進捗状況

新庁舎建設工事は、令和8年1月30日現在、建物周辺の足場が解体され、建物の全体が確認できるようになりました。現在、内装工事が進められており、また思いやり駐車場などの屋根部分となる底の工事も行われています。



新庁舎建設工事現場写真（消防署側から）



新庁舎建設工事現場写真（南東側から）

薩南工業高等学校から木製のイスを寄贈されました

薩南工業高等学校の生徒が製作した木製の椅子が寄贈されました。

扇形の特徴的なイスで、組み合わせ方により、さまざまな形で使用することができます。新庁舎内で大切に使用させていただきます。



知覧小学校緑の少年団が新庁舎の市産木材の活用をテーマに発表

知覧小学校の緑の少年団が、12月14日に開催された「令和7年度鹿児島県緑の少年団活動発表大会」で新庁舎の市産木材の活用をテーマにした発表を行い、優秀賞を受賞しました。

同少年団は、広報紙6月号「#5南九州市産木材の活用について」を見て、南九州市内で伐採された木が木材として加工されるまでの課程を発表のテーマにしました。実際に新庁舎建設現場、木材加工センターなどを見学し、学んだ内容を発表しました。




新庁舎建設工事の工事期間の延長等について


新庁舎建設工事の工事期間について、これまで休日に現場稼働をするなどして工期内の完成を目指して工事を進めてきましたが、豪雨や台風などの気象状況、馬毛島自衛隊基地整備など社会情勢による職人確保の困難などが影響し、工事期間内での完成が見込めないことから、工事期間を延長することとなりました。

工事監理者と変更工程表を精査・協議し、以下のとおり工事期間を延長することとしました。今回の工事期間の延長は、目標にしている9月開庁への影響はありません。

●広報紙令和7年3月号時のスケジュール

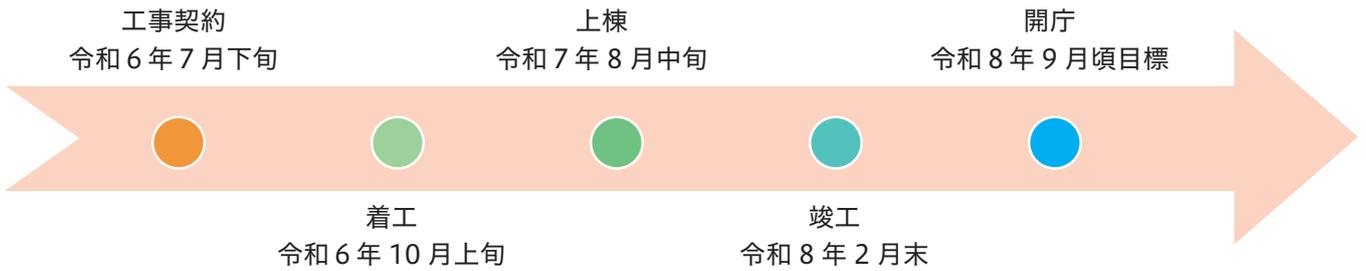

●変更後のスケジュール

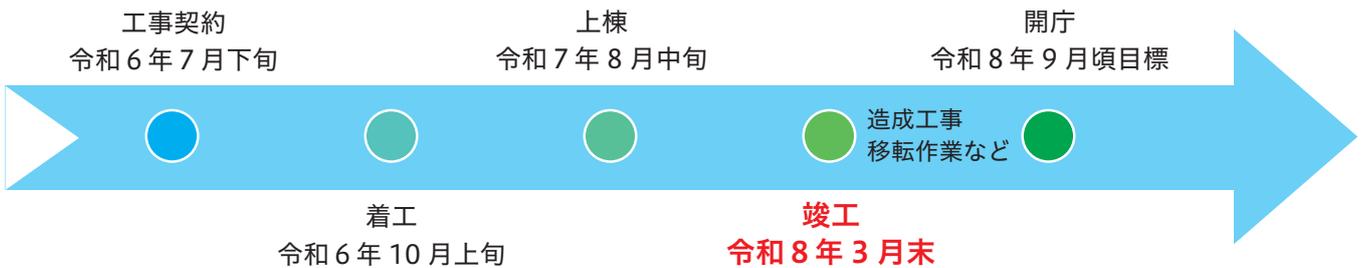

※スケジュールについては、天候などの諸事情により前後する場合があります。

工事期間の推移

工事名	当初	変更1回目	変更2回目(今回)
新庁舎建設建築工事	令和7年11月中旬	令和8年2月末	令和8年3月末
新庁舎建設電気設備工事			
新庁舎建設空調設備工事			
新庁舎建設給排水衛生設備工事			

上記4工事の工事費合計額は、工事内容の変更および物価高騰などの影響により、44億1,430万円から45億1,026万円と約9,600万円の増額となりました。

なお、市民説明会などでご説明した事業費については、現段階の見込みでは上回らない状況となっております。

今後も工事に関する変更などが発生した場合は広報紙やホームページなどでお伝えして参ります
